主要工程 ＼ 月　日	2020年5月																														6月			備　考
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	
・配水管撤去工 φ300mm L=54.3m φ250mm L=73.6m φ200mm L=16.1m φ100mm L=4.1m																				φ250配水管撤去						φ100配水管撤去								
・配水管布設工 φ600mm L＝144.4m φ250mm L＝38.0m φ200mm L＝113.6m φ50mm L＝44.5m											φ50配水管布設		φ250配水管布設						φ200配水管布設																
・仮設配水管撤去工 ・配水管接続工																											配水管接合及び仮設配水管撤去								
・行事等	4月25日～5月10日：ゴールデンウィーク工事抑制期間																																		

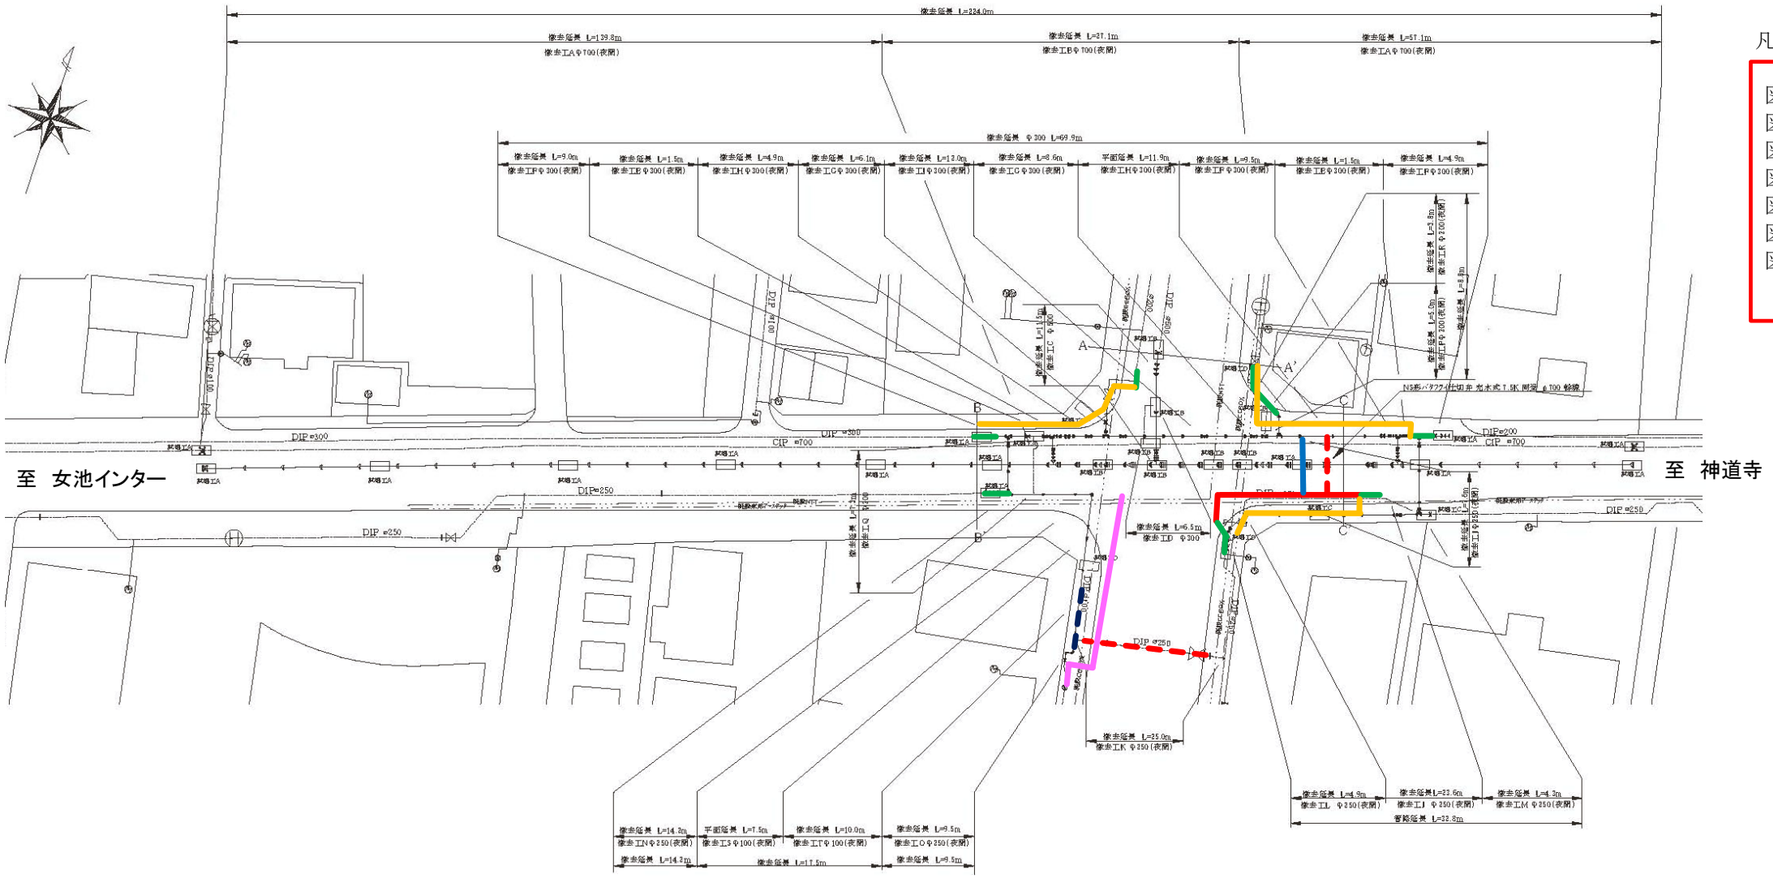

凡例

図の実線（赤色）・・φ250配水管布設
図の実線（青色）・・φ200配水管布設
図の実線（紫色）・・φ50配水管布設
図の点線（赤色）・・φ250配水管撤去
図の点線（青色）・・φ100配水管撤去
図の実線（緑色）・・配水管接続工
図の実線（黄色）・・φ150仮設配水管撤去
